



■建替計画について

STEP. 0: 現況(既存校舎)

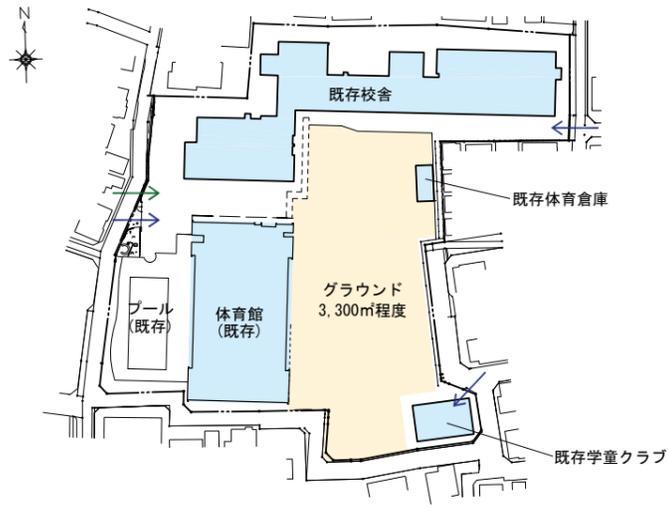


STEP. 1: 道路状整備工事(3ヶ月)

令和6年7月～令和6年9月予定

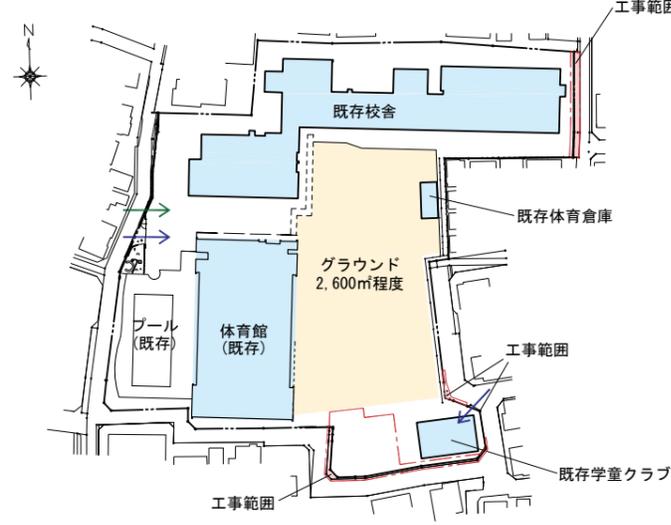


STEP. 2: 仮設校舎 建設(8ヶ月)・体育館空調設置等(4ヶ月)

令和6年12月～令和7年7月予定

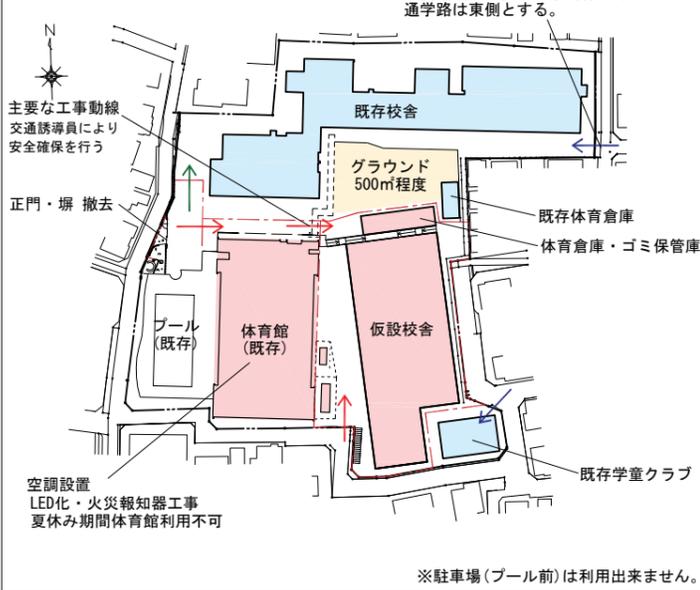


STEP. 3: 既存校舎 解体(7ヶ月)

令和7年9月～令和8年3月予定

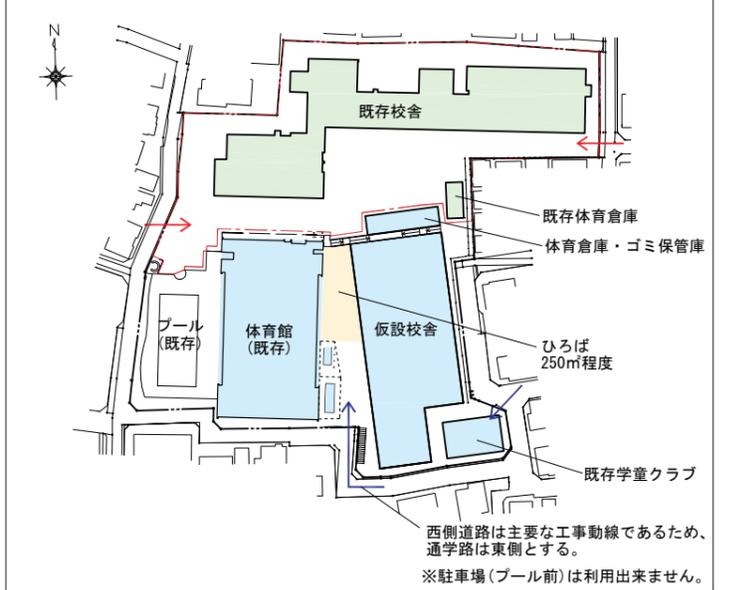


STEP. 4: 新設校舎 建設(21ヶ月)・体育館外壁・屋根改修(3ヶ月)

令和8年4月～令和9年12月予定

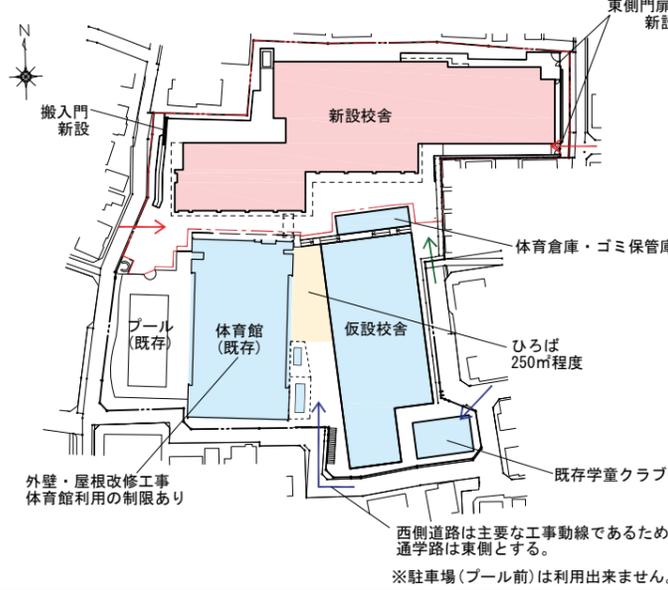


STEP. 5: 仮設校舎 解体(6ヶ月)

令和10年1月～令和10年6月予定

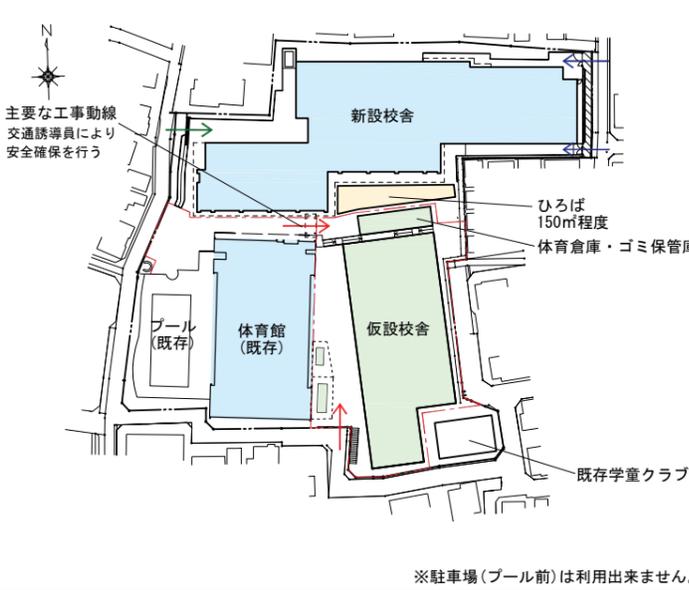


STEP. 6: グラウンド整備(7ヶ月)・学童クラブ解体(2ヶ月)

令和10年6月～令和10年12月予定

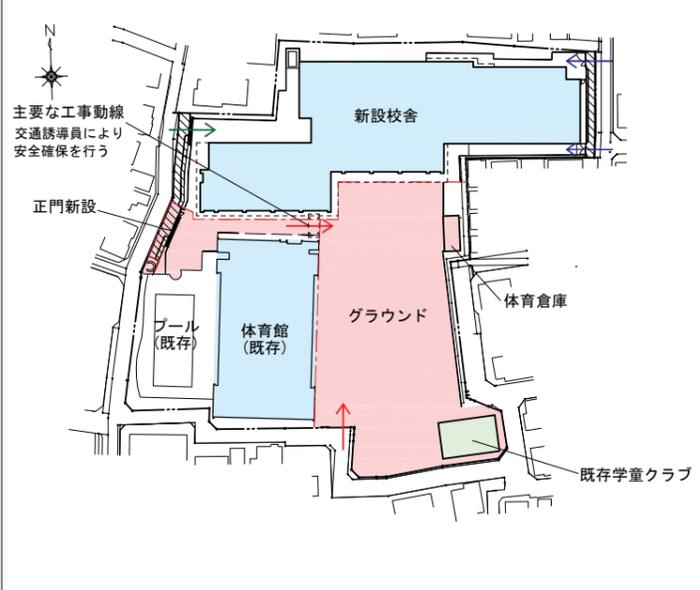

STEP. 7: 完成・引き渡し

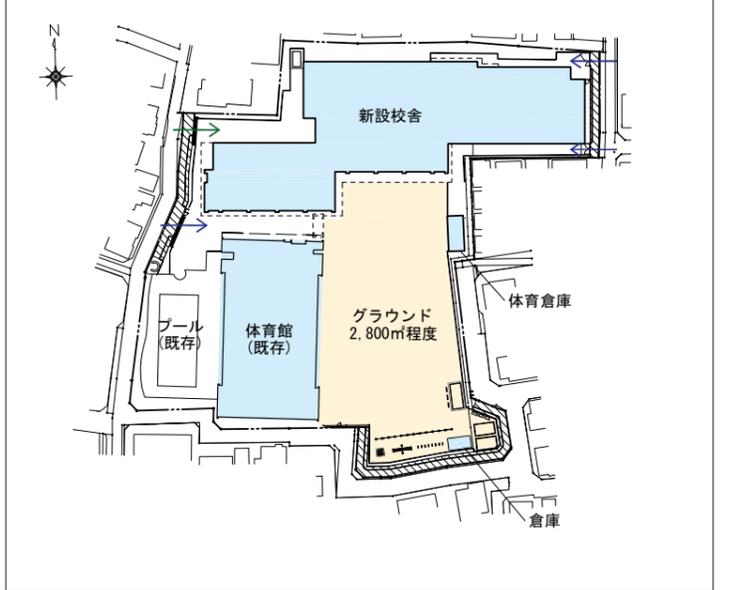

- 凡例
- 工事建物・範囲を示す。
- グラウンド範囲を示す。
- 利用中建物を示す。
- 解体建物を示す。
- 歩道状空地範囲を示す。
- 工事動線を示す。
- 児童動線を示す。
- 仮囲いを示す。
- 給食車両動線を示す。

工事概略工程表

	令和6年			令和7年			令和8年			令和9年			令和10年			令和11年							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
学校	既存校舎利用			引越			仮設校舎利用			引越			新設校舎利用										
プール	プール期間			プール期間			プール期間			プール期間			プール期間										
体育館				体育館使用不可			体育館使用制限																
STEP.1	道路状整備工事			STEP.2 仮設校舎工事			STEP.3 既存校舎解体工事			STEP.4 新設校舎工事			STEP.5 仮設校舎解体工事			STEP.6 完成							
STEP.2				体育館空調設置			体育館LED化・火災報知器工事			体育館外壁・屋根改修			グラウンド整備・倉庫新設工事			学童解体工事							
凡例	■ 新設工事			■ 改修設置工事			■ 解体工事																
