

練馬区立立野小学校仮設校舎建設工事 工事説明会資料

開催日時：令和7年10月17日(金) 18:30～19:30

開催場所：練馬区立立野小学校 1階 家庭科室

目 次

P 2	①工事ステップ図
P3	②計画概要
P4~8	③仮設校舎配置図・平面図・立面図
P9	④搬出入経路図
P10~11	⑤仮設計画図
P12~13	⑥工事工程表・工事車両、重機イメージ
P14~16	⑦工事期間中の近隣の方への配慮について(1)~(3)
P17	⑧仮設校舎工事に関するお問い合わせ

ステップ1/7



②計画概要

工事場所：練馬区立野町17-13

立野小学校敷地内（校庭）

工事期間：令和7年11月1日～令和8年7月末(予定)

構造・規模： 建築面積：1,596.56m²


延床面積：4,732.32m²

構 造：軽量鉄骨造


階 数：3階建て(9.6m)

工事内容：仮設校舎、渡り廊下、体育倉庫・防災備蓄倉庫・
自転車置き場・ポンプ庫等建設、外構整備


③仮設校舎配置図

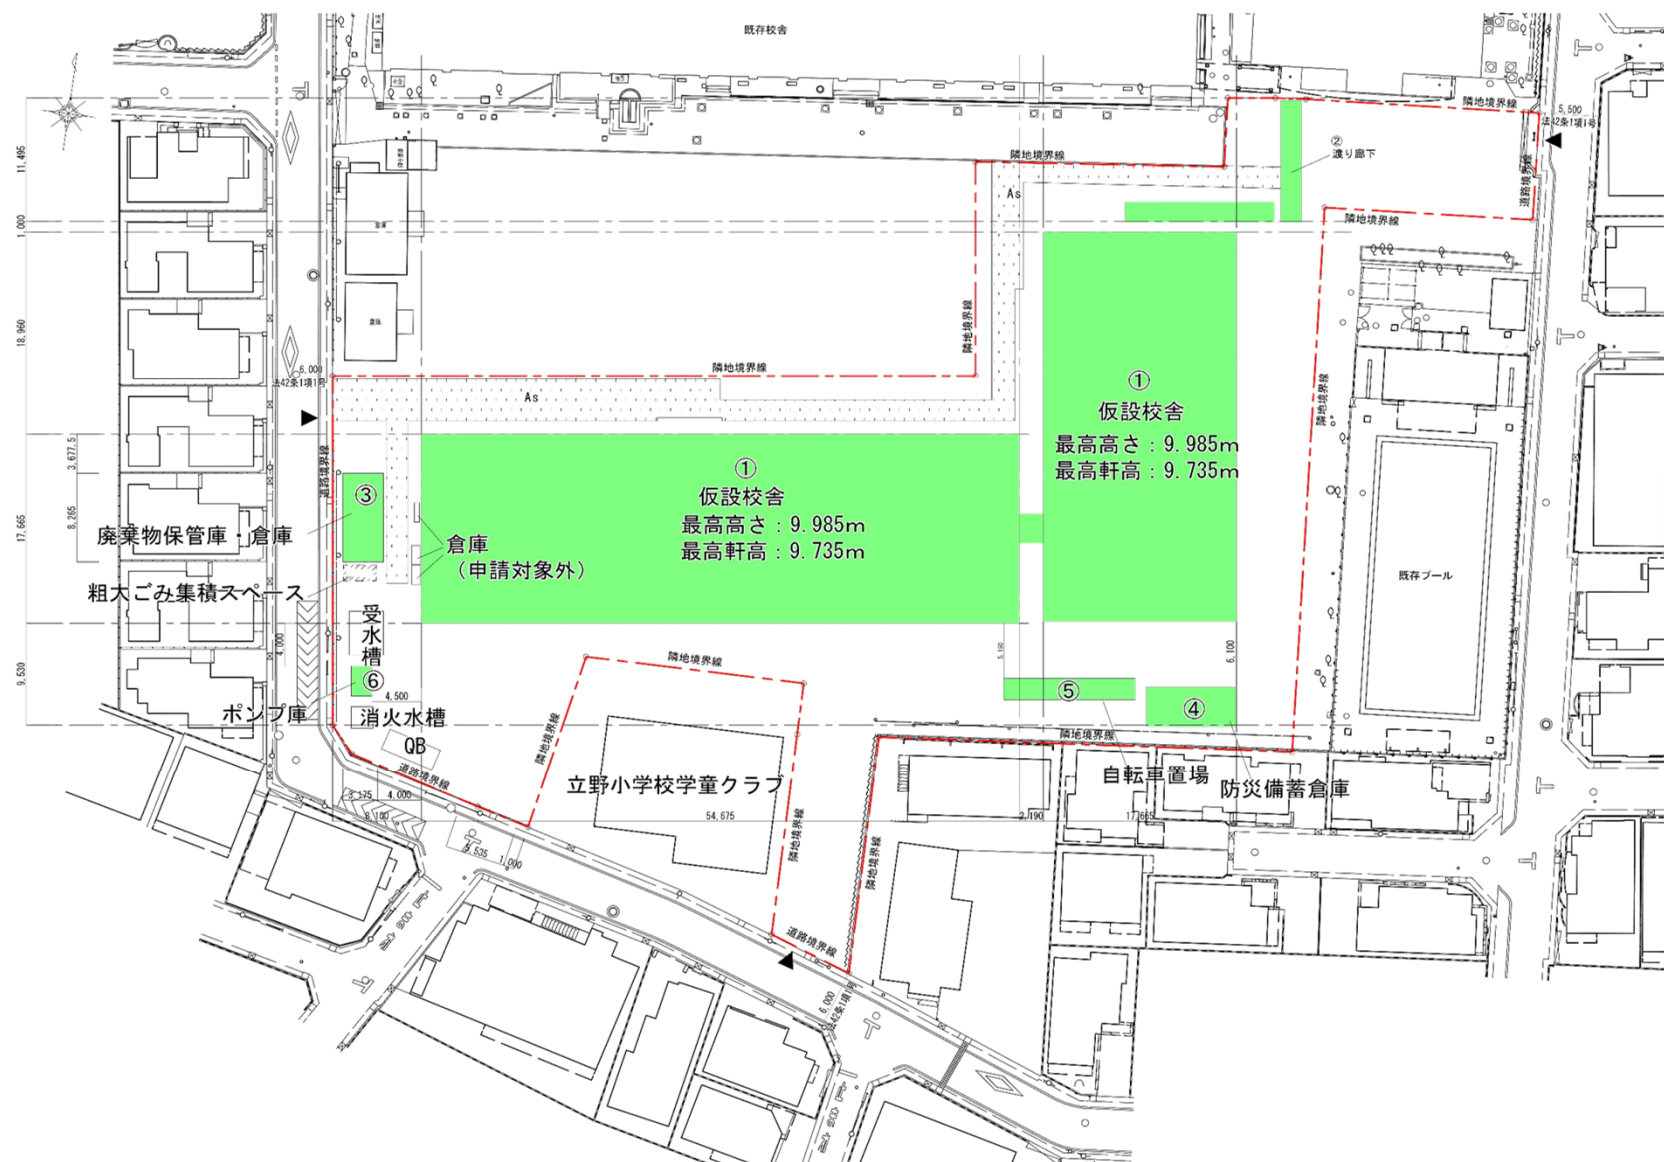


③ 1F平面図

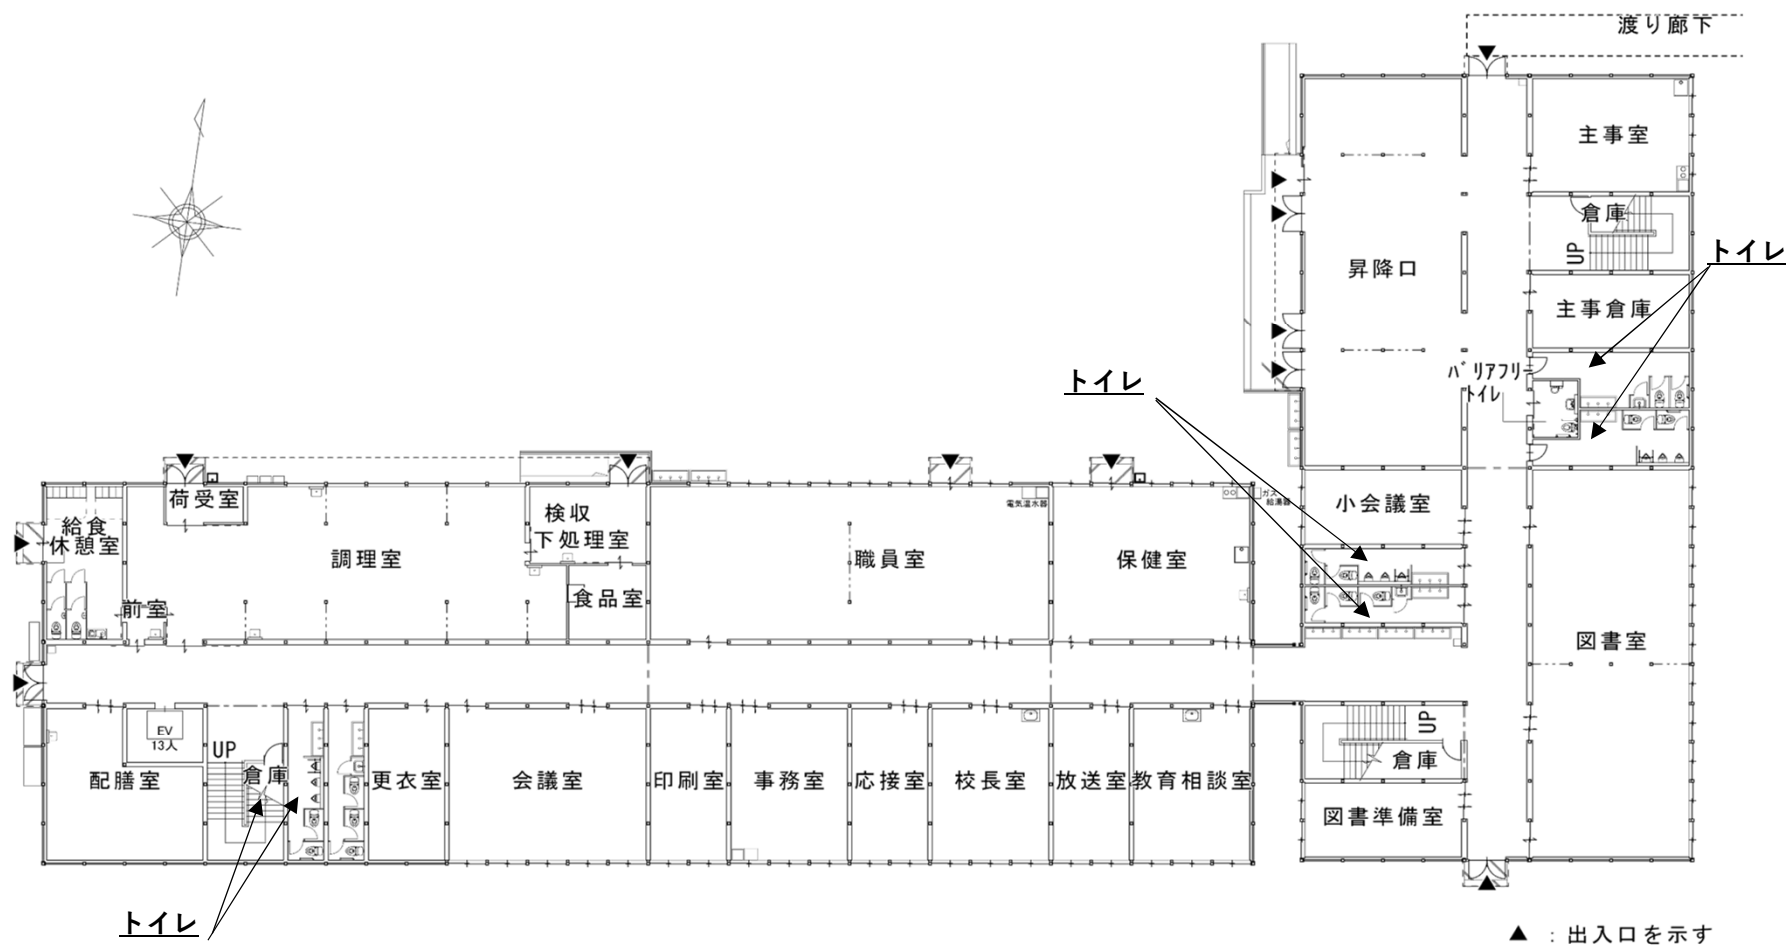


③ 2F平面図

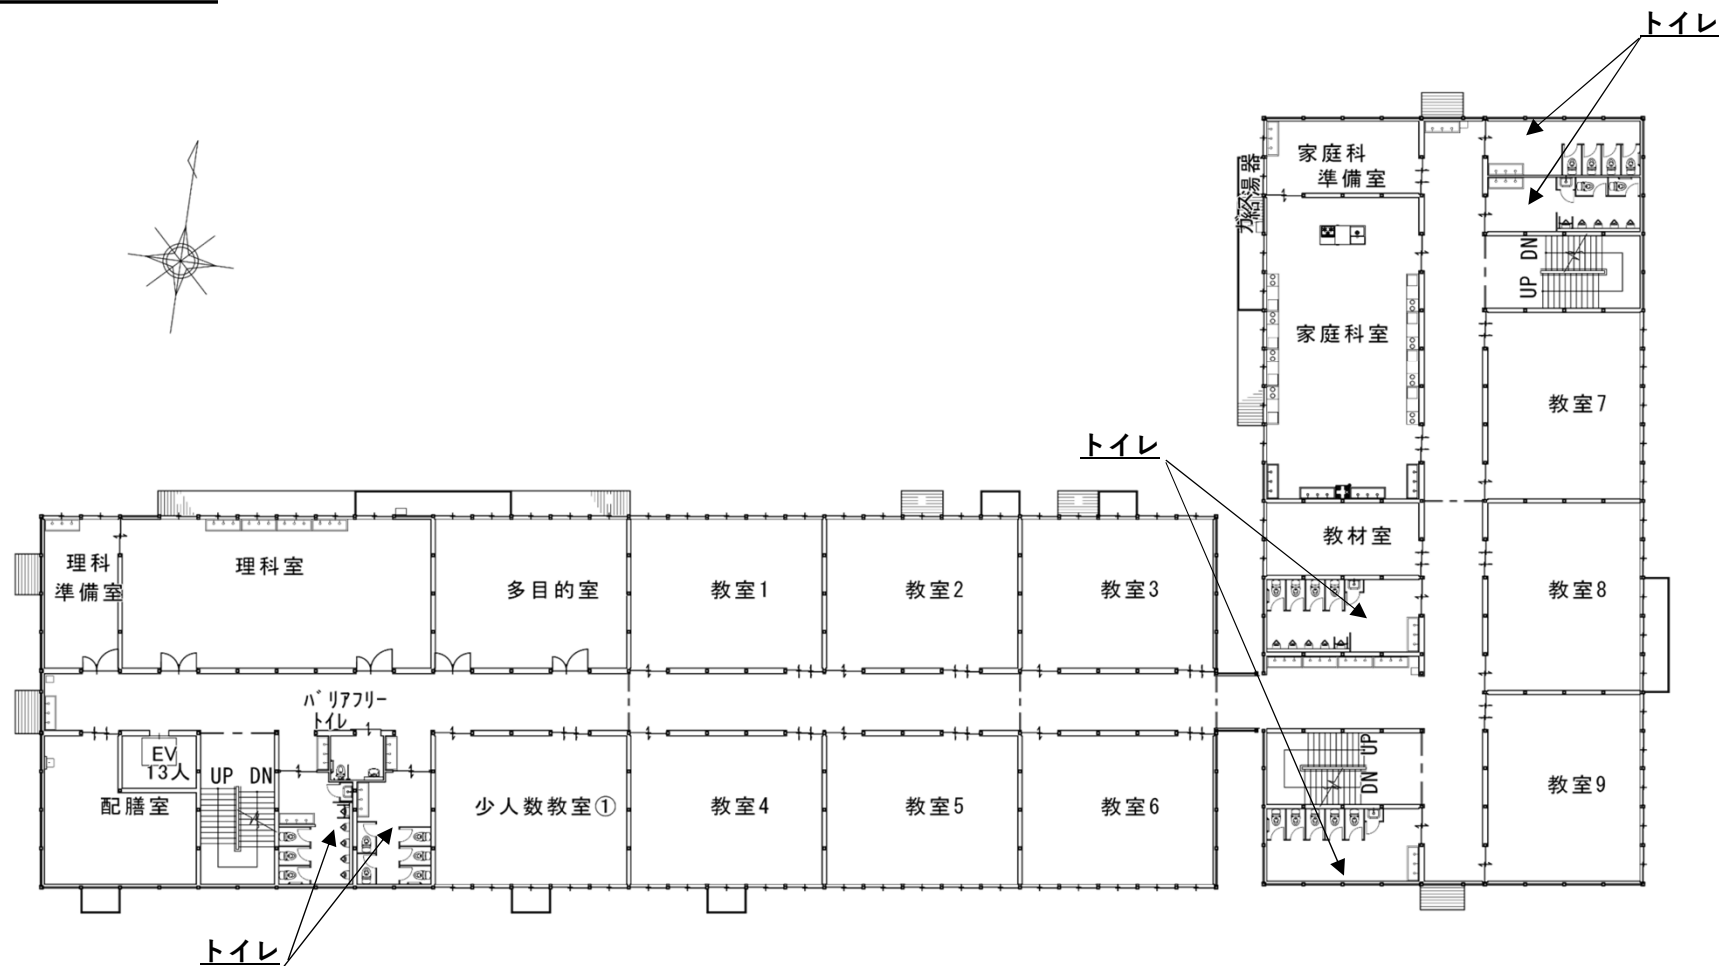


③ 3F平面図

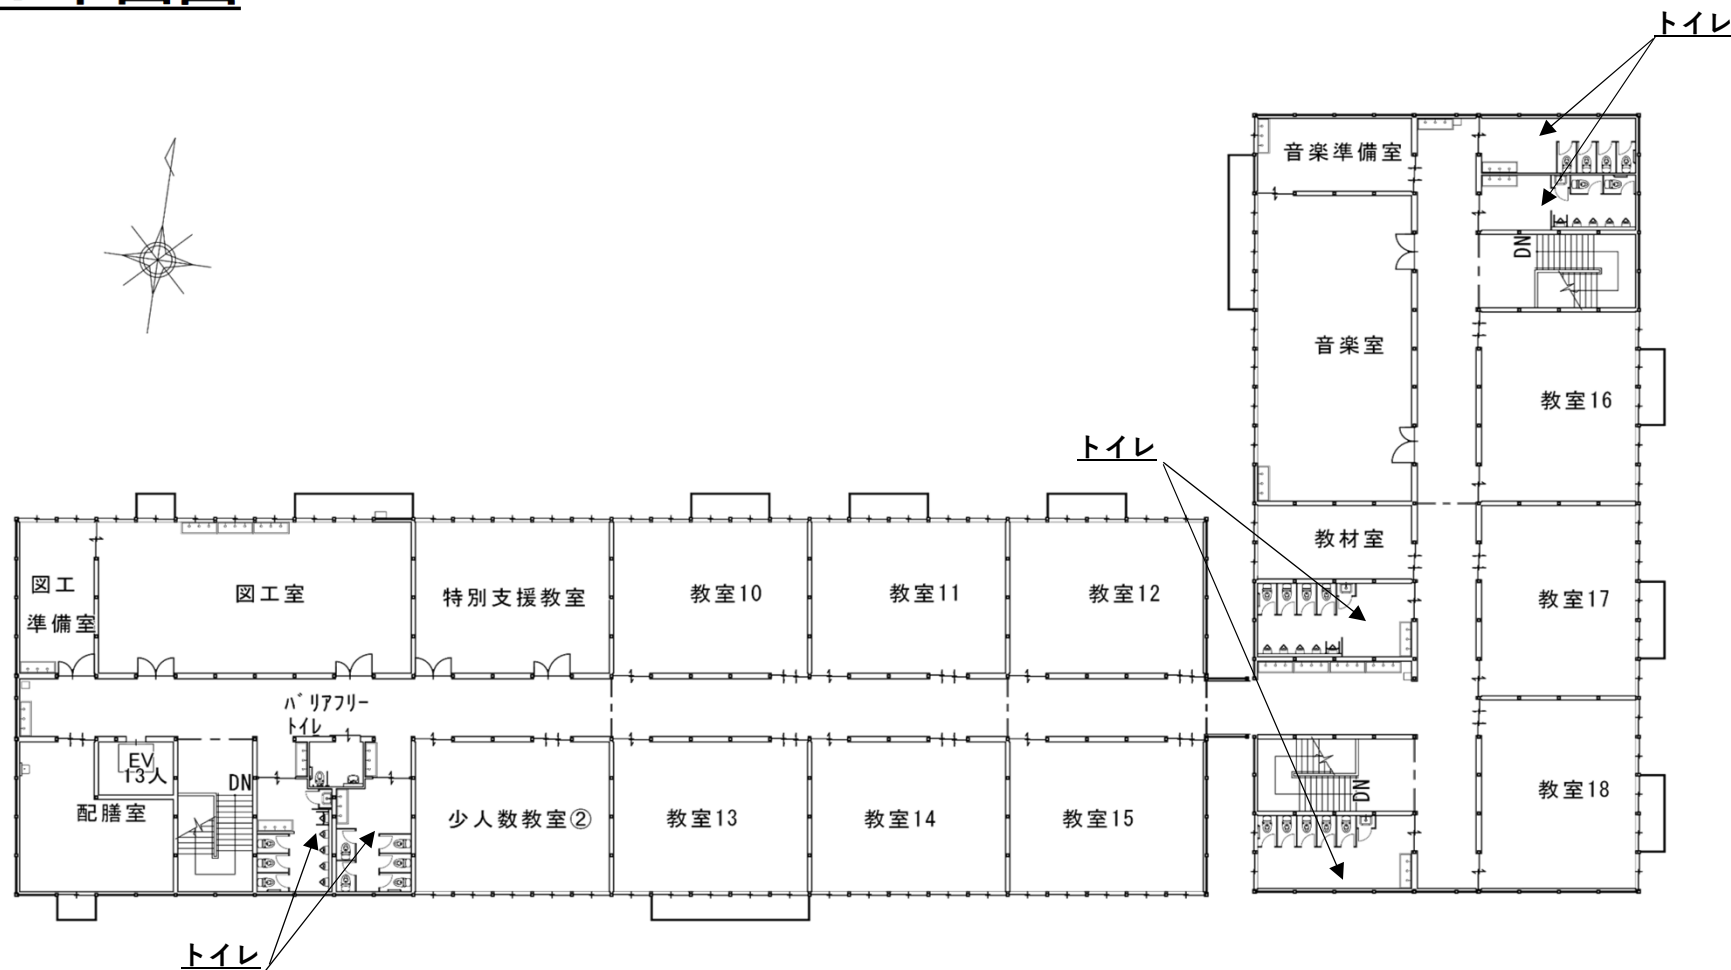


③立面図

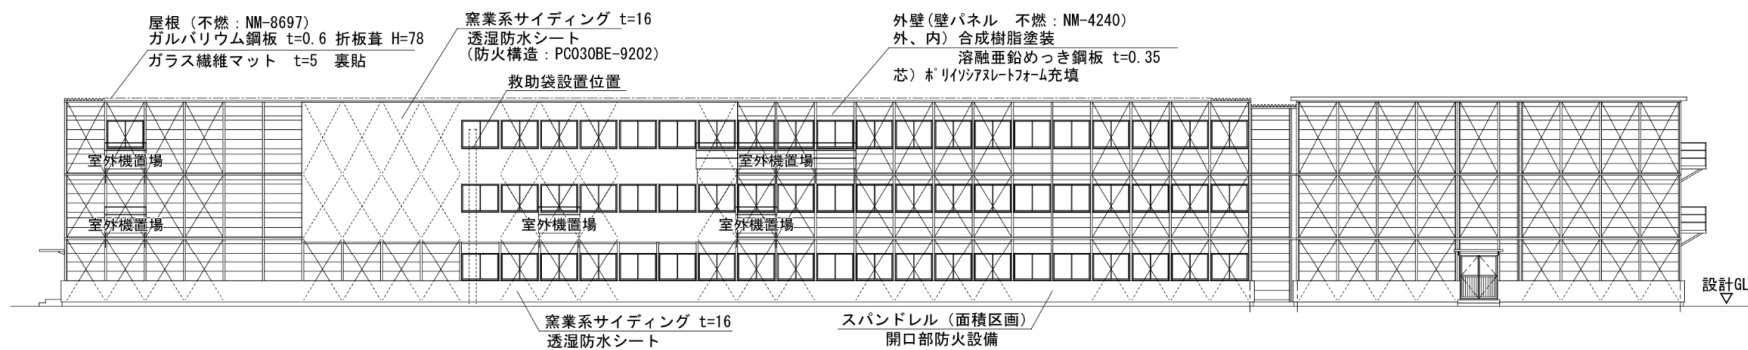


南側



西側



東側




北側

※中・大型車両はスクールゾーンのため8：45～入場予定

 2 t 超の大型車の経路

⑤仮設計画図(既存物撤去時)

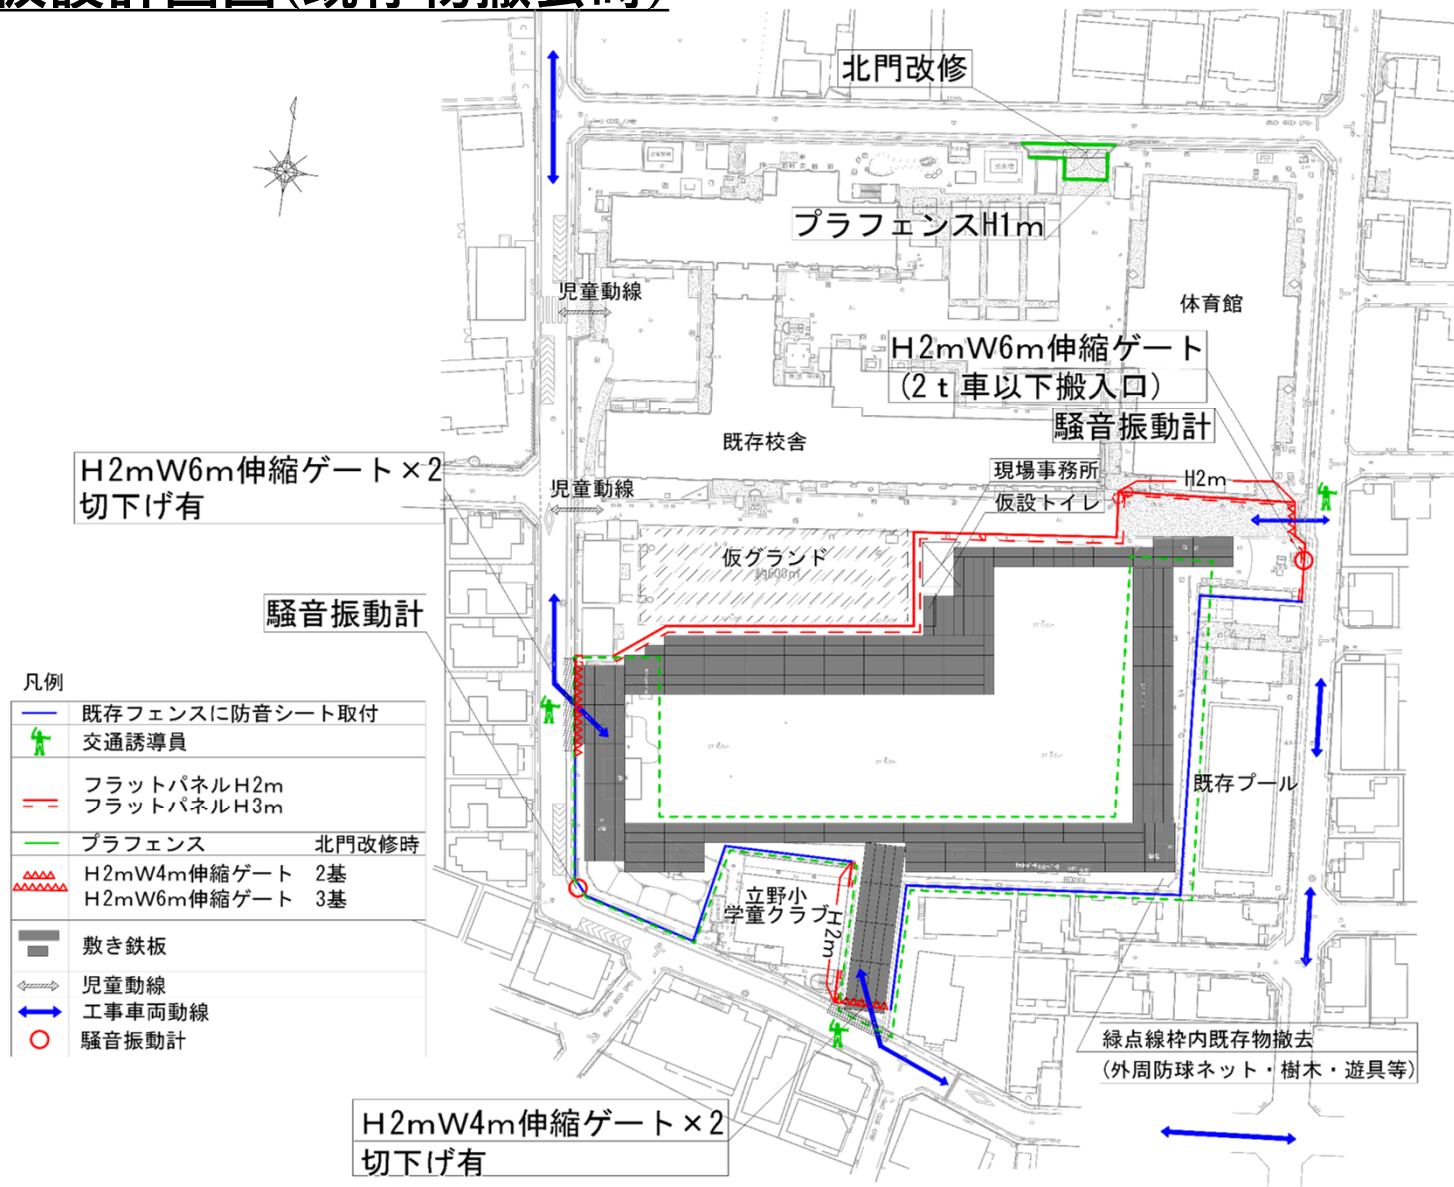

⑤仮設計画図(仮設校舎建設時)



プラフェンスイメージ

H2mW6m伸縮ゲート
(2 t 車以下搬入口)

騷音振動計



フラットパネルイメージ

⑥工事工程表

年	令和7年(2025年)			令和8年(2026年)							
工事種別/月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
仮設工事		鉄板敷き・仮囲い・事務所設営等							鉄板敷き・仮囲い・事務所撤去		
既設物撤去工事		敷地境界沿い防球ネット・樹木等撤去									
杭工事			西棟→東棟								
基礎工事				西棟→東棟							
本体工事						西棟→東棟					
内装・装飾工事						床張り・LGS・ボード関係工事			装飾・仕上げ工事		
設備工事						電気・給排水	ガス・空調工事				
外構工事		工事車両進入口整備等					外部スロープ・渡り廊下・舗装等				
検査等・その他			年末年始休暇中7年12/28～R8年1/4								
(大型工事車両等)											
トラック(8t、10t)			鋼管杭運搬等		鉄骨資材運搬等						
		撤去物搬出ダンプ		残土運搬等							
バックホウ		既設物撤去・杭打ち込み・基礎掘削、埋戻し合番作業							舗装下地整備等合番作業		
クレーン車					鉄骨工事合番作業						
生コン・ポンプ車				基礎コンクリート打設			外構コンクリート打設				
(その他工事車両)	※上記大型工事車両の他に資機材搬入等で4t車両等が入り致します。										
騒音	小	大		中			大		中		小
振動	小	大		大				中			小

⑥工事車両・重機イメージ

10 t 平トラック



10 t ダンプ



ラフタークレーン



バックホウ




⑦工事期間中の近隣の方への配慮について

1. 作業時間は原則、午前8時から午後6時までとします。
※準備や片づけは作業時間の前後で行います。
2. 原則、日曜日及び祝日は作業を行いません。
※内装工事等、騒音振動の発生しない軽微な作業
については作業を行う場合があります。
※日曜・祝日に作業する場合は事前にご連絡致します。
3. 工事車両の出入口に誘導員を配置し事故の防止に
万全を期します。
4. 喫煙は工事現場敷地内に喫煙所を設け、
指定の場所のみで喫煙します。

⑦工事期間中の近隣の方への配慮について(2)

5. 工事関係の車両は、路上駐車はせず工事現場内や最寄の時間貸し駐車場等に駐車致します。
6. 工事中は低騒音・低振動の重機を使用し、騒音・振動に配慮して作業を行い、騒音振動計を設置いたします。
(設置場所はP.11⑤仮設計画図に記載)
7. 工事中は週間のスケジュールを見やすい場所に掲示致します。
8. 工事エリアは仮囲いにて区画を行い、関係者以外が立ち入れないように致します。

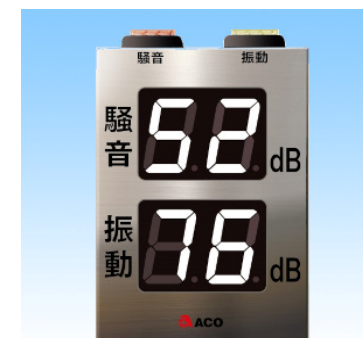

騒音振動計参考

ご近所の皆様へ

月	日	曜	作業工程
/	/	月	
/	/	火	
/	/	水	
/	/	木	
/	/	金	
/	/	土	
/	/	日	

安全最優先で作業をしております
連絡先 東海リース㈱ 東京支店 Tel.03(3433)1700

週間スケジュール参考

⑦工事期間中の近隣の方への配慮について(3)

9. 工事中は作業員全体が一体となった作業を行い、
労働災害事故防止に努めます。

10. 現場周辺道路では工事車両は徐行させます。

11. 周辺道路を汚さないように注意致します。
汚損があった場合は清掃、復旧致します。

そのほか、近隣の皆様にご迷惑のないよう最善の努力を
行い工事を進めてまいります。問題が生じた場合は
誠意をもって対応致します。

⑧仮設校舎工事に関するお問い合わせ

東海リース株式会社 東京支店 03-3433-1700

営業担当 天野(アマノ) 080-3100-7313
福永(フクナガ) 080-3100-7384

工事担当 本多(ホンダ) 080-3018-4533

練馬区教育委員会事務局 教育振興部

学校施設課 学校整備担当係 永野、今村

03-5984-1072

その他仮設校舎に関する事項のお問い合わせは上記
連絡先へご連絡ください。
