



建替計画図 1/2000

STEP. 0: 現況 (既存校舎)

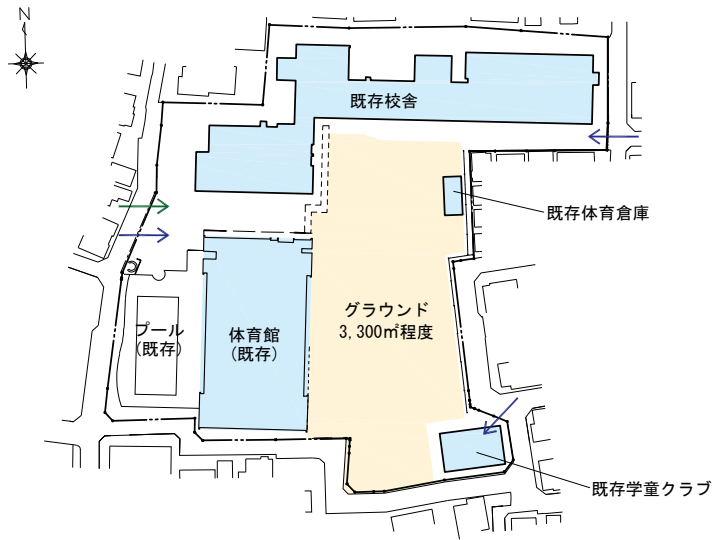


STEP. 1: 道路状整備工事 (3ヶ月)  
令和5年10月～令和5年12月予定

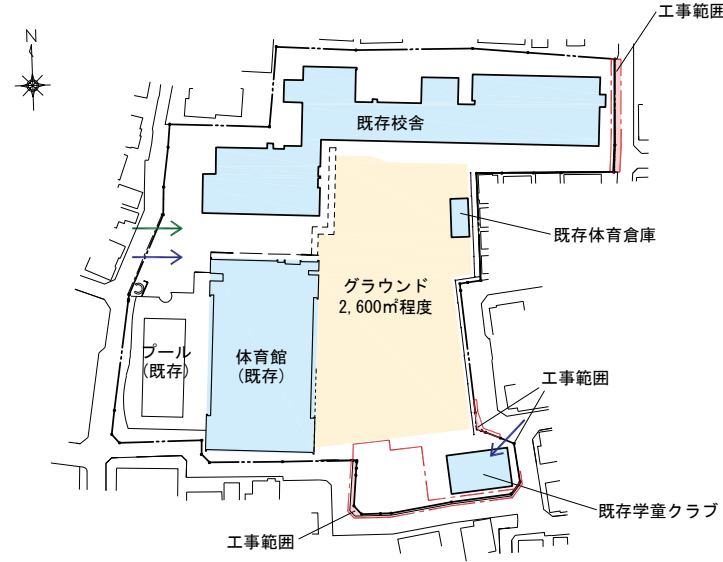


STEP. 2: 仮設校舎 建設 (7ヶ月)・体育館空調設置等 (4ヶ月)  
令和6年1月～令和6年9月予定




STEP. 3: 既存校舎 解体 (7ヶ月)  
令和6年9月～令和7年3月予定

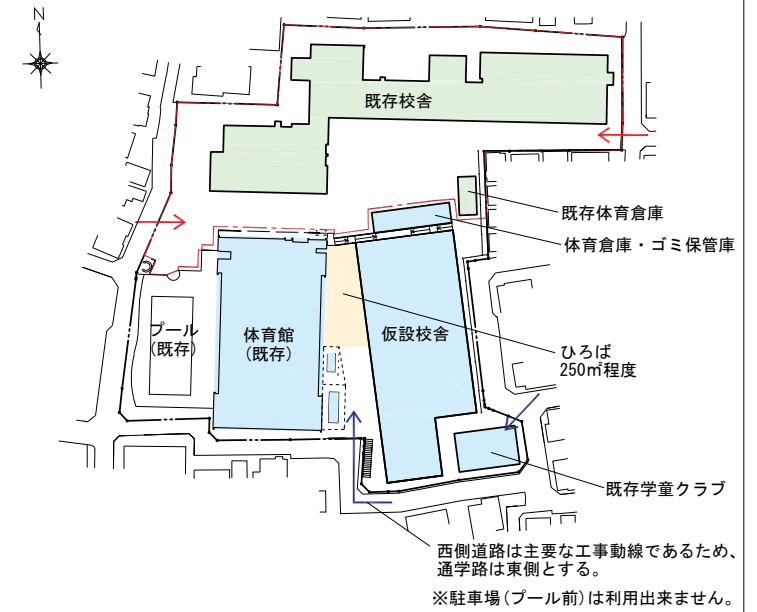


STEP. 4: 新設校舎 建設 (21ヶ月)・体育館外壁・屋根改修 (3ヶ月)  
令和7年4月～令和8年12月予定

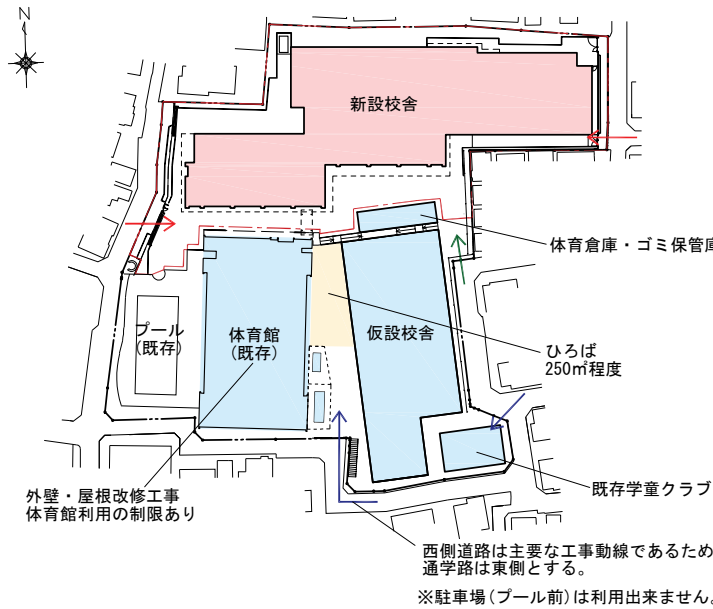


STEP. 5: 仮設校舎 解体 (5ヶ月)  
令和9年1月～令和9年5月予定

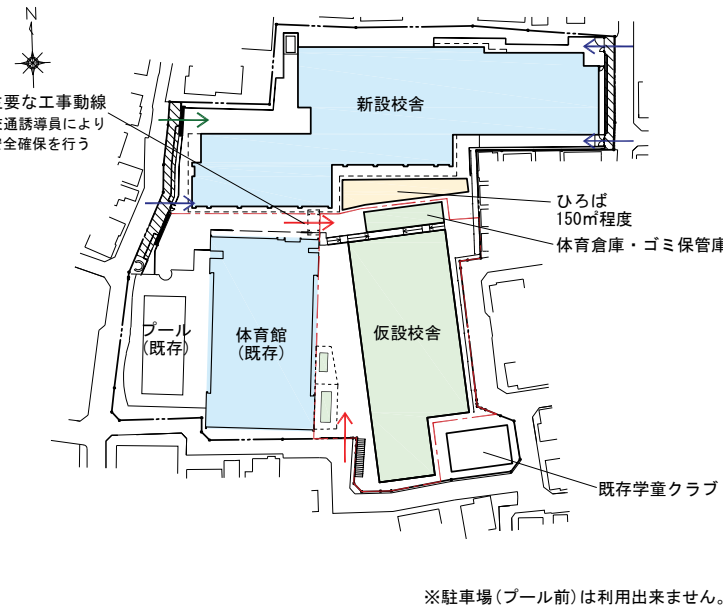

STEP. 6: グラウンド整備 (7ヶ月)・児童クラブ解体 (2ヶ月)  
令和9年6月～令和9年12月予定

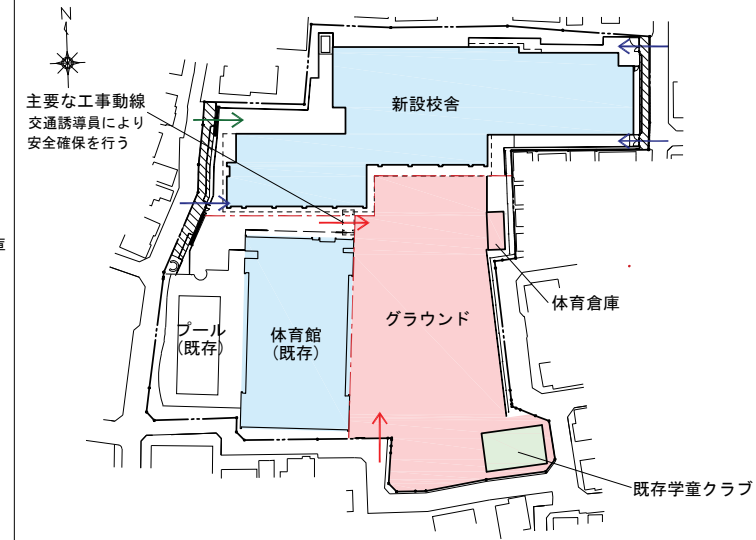

STEP. 7: 完成・引き渡し

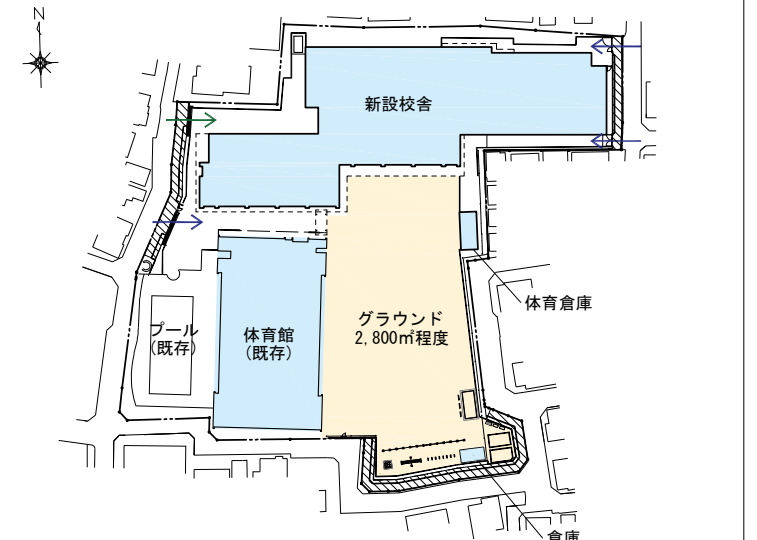

- 凡例
- : 工事建物・範囲を示す。
  - : 解体建物を示す。
  - : 利用中建物を示す。
  - : グラウンド範囲を示す。
  - : 歩道状空地範囲を示す。
  - : 工事動線を示す。
  - : 仮囲いを示す。
  - : 児童動線を示す。
  - : 給食車両動線を示す。

工事概略工程表

|                | 令和5年   |   |   | 令和6年   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 令和7年   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 令和8年   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 令和9年   |   |   | 令和10年  |  |  |        |  |  |       |  |  |
|----------------|--------|---|---|--------|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|-------|--|--|
|                | 4      | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 |        |  |  |        |  |  |       |  |  |
| 学校             | 夏休     |   |   | 既存校舎利用 |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 仮設校舎利用 |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 新校舎利用  |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 冬休     |   |   | 春休     |  |  | 夏休     |  |  | 冬休    |  |  |
| プール            | プール期間  |   |   | プール期間  |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | プール期間  |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | プール期間  |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | プール期間  |   |   | プール期間  |  |  | プール期間  |  |  | プール期間 |  |  |
| 体育館            | 夏休     |   |   | 夏休     |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 夏休     |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 夏休     |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 夏休     |   |   | 夏休     |  |  | 夏休     |  |  | 夏休    |  |  |
| 体育館空調設置        | STEP.1 |   |   | STEP.2 |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | STEP.3 |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | STEP.4 |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | STEP.5 |   |   | STEP.6 |  |  | STEP.7 |  |  | 完成    |  |  |
| 体育館外壁・屋根改修     |        |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |  |       |  |  |
| 道路状整備工事        |        |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |  |       |  |  |
| 仮設校舎工事         |        |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |  |       |  |  |
| 既存校舎解体工事       |        |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |  |       |  |  |
| 新設校舎工事         |        |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |  |       |  |  |
| 仮設校舎解体工事       |        |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |  |       |  |  |
| グラウンド整備・倉庫新設工事 |        |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |  |       |  |  |
| 児童クラブ解体工事      |        |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |  |       |  |  |

凡例

- : 新設工事
- : 改修設置工事
- : 解体工事

※本資料の面積・工期・配置等は予定案のものです。
